




미래사업과



순서

I. 2019년도 추진목표 및 추진전략

II. 2019년도 주요업무 추진상황

1. 연무 관광자원 활성화 사업
2. 탐정호 수변개발사업
3. 강경 근대역사 문화도시 조성
4. 충청유교문화원 건립사업
5. 충청유교문화권 개발사업

I. 2019년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 미래 성장동력 창출을 위한 지속가능한 지역 핵심사업 발굴 및 추진
- 인문정신·전통문화에 바탕을 둔 융복합 문화콘텐츠 개발
- 지역 속 경쟁력을 갖춘 핵심 관광콘텐츠 육성

추진전략

◇ 논산의 지속가능한 미래 성장동력 구축

- 연무 관광자원 개발사업을 통한 관광도시 기반구축
- 탐정호 체험·휴양시설 등 개발로 체류형 관광도시 조성
- 강경 근대역사·문화 및 충청유교의 전통·가치 재조명

1 연무 관광자원 활성화사업

‘선샤인랜드’ 일원 개발을 통한 관광자원 확충



명 칭	주요 시설현황
밀리터리 체 험 관	<ul style="list-style-type: none"> · 서바이벌 체험장, 스크린·비비탄 사격장, VR 체험관(4,629m²) ⇒ 사업비 71억원, 사업기간 2013~2017 ⇒ '17. 11. 8. 개장 (관광체육과 운영 중)
1950 낭만스튜디오	<ul style="list-style-type: none"> · 관람시설, 영화·드라마 등 촬영장(3,636m²) ⇒ 사업비 36억원, 사업기간 2017(단년도 사업) ⇒ '17. 11. 8. 개장 (관광체육과 운영 중)
선 샤 인 스튜디오	<ul style="list-style-type: none"> · 관람시설, 영화·드라마 등 촬영장(17,380m²) ⇒ 사업비 111억원, 사업기간 2017~2018 ⇒ '18. 10. 31. 개장(SBS A&T 사용 중)

□ 그동안 추진상황

- '12. 6. : 육군훈련소 병영테마파크 조성 기본계획 수립
- '14. 11. : 밀리터리파크 조성사업(1차분) 착공
- '15. 12. : 밀리터리파크 조성사업(1차분) 준공
- '17. 2. : 밀리터리파크 조성사업(2차분) 착공
- '17. 9. : 연무 관광자원조성사업 기본계획 수립

- '17. 11. : 선샤인스튜디오 조성 업무협약 체결(市↔SBS A&T),
선샤인스튜디오 조성사업 착공,
밀리터리체험관, 1950 낭만스튜디오 개장
- '17. 12. : 밀리터리파크 조성사업(2차분) 준공
- '18. 5. : 연무 관광자원조성사업 기본계획(변경) 수립
- '18. 7. : 선샤인스튜디오 조성사업 준공
- '18. 9. : 선샤인스튜디오 시설물 기부채납 및 소유권 이전(SBS A&T→市)
선샤인스튜디오 시설물 무상사용·수익허가(市→SBS A&T)
- '18. 10. : 선샤인스튜디오 개장
- '18. 11. : 선샤인랜드 활성화를 위한 업무협약
(道+市+한국관광공사+화앤담+SBS A&T),
선샤인랜드 주차장 조성사업(1차분) 착공
- '19. 2. : 선샤인랜드 추가 진출입로 도시계획시설(도로) 결정용역 착수
- '19. 5. : 선샤인랜드 주차장 조성사업(1차분) 준공
- '19. 6. : 선샤인랜드 개발 종합계획(호국문화체험단지 조성 포함) 수립용역 발주

□ 앞으로 추진계획

- '19. 8. : 선샤인랜드 추가 진출입로 도시계획시설(도로) 결정용역 완료
- '20. 3. : 선샤인랜드 주차장 조성사업(2차분) 착공,
선샤인랜드 추가 진출입로 공사 착공
- '20. 4. : 호국문화체험단지 조성사업 착공
- '20. 8. : 선샤인랜드 추가 진출입로 공사 준공,
선샤인랜드 개발 종합계획(마스터플랜) 수립용역 완료
- '20. 9. : 선샤인랜드 주차장 조성사업(2차분) 준공
- '21. 4. : 호국문화체험단지 조성사업 준공

2 탐정호 수변개발사업

탐정호 수변개발 사업을 통한 복합·체류형 관광명소 조성

관 광 콘 텐 츠
개 발

체 류 형
관 광 자 원 개 발

민 간 투 자
유 치

- ① 딸기향 농촌테마공원 조성
- ② 힐링생태체험교육관 조성
- ③ 신평 수변산책로 조성
- ④ 출렁다리 조성
- ⑤ 수변개발 투자 유치 추진

□ 총괄개요

(단위:백만원)

시행자	사 업 명	사업기간	사업량	사업비	비고
시(市)	합 계			35,613	
	딸기향 농촌테마공원 조성	2014~2020	농촌체험 휴양공간 A=89,962㎡ (공사비 9,874 / 보상비 5,850)	16,433	
	탐정호 힐링생태체험교육관	2013~2018	건축2층, 전시체험시설 1식 (건축 727㎡ / 연면적 942㎡)	6,380	
	신평 수변산책로 조성	2018~2019	수변둘레길 조성 L=2.0Km , B=2.0m	1,800	
	탐정호 출렁다리 조성	2017~2019	출렁다리 조성 L=600m, B=2.2m	11,000	

1. 딸기향 농촌테마공원 조성

◇ 탐정호의 관광자원 발굴을 통한 도시민의 농촌체험 유도 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 부적면 충곡리 276-21번지 일원
- 사 업 비 : 16,433백만원(국비 3,937 도비 788 시비11,380 민자 328)
- 공사비 9,853백만원, 보상비 6,580백만원
- 사업기간 : 2014 ~ 2020년(7년)
- 사업내용 : 농촌체험·휴양 공간 조성(89,962㎡)

□ 그동안 추진상황

- '13. 5. : 농촌테마공원 대상지 선정(道 선정)
- '14. 7. : 사업계획 및 설계용역 착수
- '17. 8. : 농촌테마공원 기본계획 승인(道)
- '17. 10. : 특구계획 변경 승인(중소벤처기업부)
- '18. 5. : 농촌테마공원 시행계획 승인 신청(道)
- '18. 6. : 농어촌 관광휴양단지 지정 승인
- '18. 11. : 부지조성 및 건축공사 착수
- '19. 02. : 토목공사 추진(토공 및 배수공)
- '19. 04. : 건축공사 추진(건축공 및 기계공)

□ 앞으로 추진계획

- '19. 12. : 토목 및 건축공사 완료
- '20. 02. : 조경공사 추진
- '20. 03. : 전기 및 통신공사 추진
- '20. 10. : 사업 완료 및 운영

2. 탐정호 힐링생태체험교육관 조성

- ◇ 탐정호 특유의 자연·생태자원을 활용하여 농촌테마공원과 연계한 체험공간을 조성하고 관광자원화 하여 관광객 유치

□ 사업개요

- 위 치 : 부적면 충곡리 276-21번지 일원
- 사 업 비 : 6,380백만원(도비 3,100, 시비 3,280)
- 사업기간 : 2013 ~ 2018년(6년)
- 사업규모 : 지상2층(연면적942㎡), 전시시설 설치(내부 450㎡)
- 사업내용 : 어린이도서관, 그물 놀이터, 호수 영상관 등

□ 그동안 추진상황

- '14. 5. : 기본 및 실시설계용역 완료
- '14. 12. : 힐링생태체험교육관 건립공사 착공
- '15. 12. : 건축 및 부지조성공사 준공
- '16. 12.~'17. 5. : 전시체험시설 설치용역 착수 및 준공
- '17. 10. : 탐정호 힐링생태체험교육관 임시개장
- '18. 1.~6. : 전시·체험시설(2단계) 기본 및 실시설계용역 완료
- '18. 9. : 전시·체험시설 조성사업(2단계) 착공
- '19. 4. : 힐링생태체험관 소방공사(스프링클러) 착공

□ 앞으로 추진계획

- '19. 7. : 1, 2층 내부 전시시설 시험가동 운영 및 조정
공사완료 및 운영

3. 신평 수변산책로 조성

◇ 탐정호 순환체계 확립을 목적으로 단절된 수변산책로의 연결을 통한 관광활성화 및 주민 통행편익 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 부적면 신평리(탐정호 수변 일원)
- 사 업 비 : 1,800백만원(국비 400, 시비 1,400)
- 사업기간 : 2018 ~ 2020년(3년)
- 사업내용 : 수변 둘레길(데크 등) 조성 $L=2.2\text{Km}$, $B=2.0\text{m}$

□ 그동안 추진상황

- '17. 10. : 문화관광자원개발 사업비 확보(국비)
- '17. 12. : 대상지 선정 및 사업계획 수립
- '18. 5. : 충남 공공디자인센터 컨설팅 자문
- '18. 6. : 문화체육관광부 자문단 자문
- '18. 12. : 계약심사 완료(道)

□ 앞으로 추진계획

- '19. 1. : 사업발주 및 착수
- '19. 2. ~ 10. : 포장공 추진(데크로드 및 마사토 포장)
- '19. 12. : 사업 완료 및 개통

※ 참고자료

◇ 탐정호 순환체계 구축

- 위 치 : 부적면 신평리(탐정호 제방) ~ 양촌면 신흥리(신흥교)
- 사업내용 : 순환둘레길 조성 L=6.54km, B=1.8 ~ 2.0m
- 사업비 : 6,433백만원

사업명	현황	사업개요
탐정호 수변데크 둘레길	조성 완료	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 부적면 신평리(탐정호 제방) ~ 충곡리(수변생태공원) - 사업비 : 3,833백만원(국 1,833/도 750/시 1,250) - 사업기간 : 2013 ~ 2017년(5년) - 사업내용 : 수변데크 조성 L=2.94km, B=1.8~2.0m
탐정호 순환둘레 길 조성	실시 설계 중	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 부적면 신평리(수변생태공원) ~ 양촌면 반곡리 - 사업비 : 800백만원(도 400/시 400) - 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년) - 사업내용 : 순환둘레길 조성 L=1.4km, B=2.0m
신평수변 산책로 조성	사업 추진 중	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 양촌면 반곡리 ~ 신흥리(신흥교) - 사업비 : 1,800백만원(국 400/시 1400) - 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년) - 사업내용 : 수변산책로 조성 L=2.2km, B=2.0m

4. 탐정호 출렁다리 조성

◇ 탐정호 관광랜드마크 건설을 통한 기존 수변개발사업과의 연계 및 관광객 유치로 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 위 치 : 부적면 신평리~가야곡면 종연리 일원
- 사 업 비 : 11,000백만원(국비 4,300, 도비 2,150, 시비 4,550)
- 사업기간 : 2017 ~ 2019년(3년)
- 사업내용 : 출렁다리 조성(L=600m, B=2.2m)

☐ 그동안 추진상황

- '16. 10. : 지방재정 투자심사 승인(道)
- '17. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수
- '18. 1. : 출렁다리 주탑 디자인 선정
- '18. 5. : 기본 및 실시설계용역 완료
- '18. 8. : 출렁다리 조성사업 착공
- '19. 1. : 바지선 조립 및 진수 완료
- '19. 3. : 교각 기초파일 향타 완료(총 108본)
- '19. 4. : 가물막이공사 착공

☐ 앞으로 추진계획

- '19. 7. : 주차장(2,000면) 및 경관조명사업 등 추가사업 발주
- '19. 12. : 탐정호 출렁다리 조성사업 완료 및 개통 운영

5. 탐정호 수변개발 투자유치 추진

◇ 탐정호의 복합휴양관광단지 조성을 목적으로 민간투자유치를 추진하여 민·관의 성공적인 관광거점 조성

□ 추진개요

【체류형 숙박시설】

- 복합휴양형 리조트, 글램핑, 야영장 등 숙박단지
- 로컬푸드 판매장, 테마파크 등 복합휴양단지

【수상레포트】

- 수면면적 : 약 100ha
- 갈수기에도 수위가 확보되는 구간을 활용하여 적합한 수상레저 운영

□ 그동안 추진상황

【체류형 숙박시설】

- '16. 7. : 탐정호 마스터플랜 수립 관련 투자유치 대상지 분석
- '16. 9. : 탐정호 주변 투자 대상지 지역개발계획 수립용역(道) 반영 협의
- '17. 12. : 탐정호 주변 투자 대상지 지역개발계획 수립(道) 고시
- '18. 3. : 민간투자자 MOU체결(市-청암-농어촌공사)
- '18. 6. : 토지매입(일송정) 및 토지교환 추진(농어촌공사)
- '18. 12. : 탐정호 복합관광단지 지역개발사업 추진계획 검토
- '19. 1. : 탐정호 복합휴양관광단지 설계용역 발주
- '19. 5. : 탐정호 복합휴양관광단지 설계용역 착수

【수상레포트】

- '15. 9. : 수상레포트 투자유치 관련 농어촌공사(본사) 협의 완료
- '16. 5. ~ 11. : 탐정호 수면사용 의견 협의

- '16. 12. : 탐정호 수면사용 활성화 업무협약 체결
- '18. 1. : 수상레포츠 관련기관 협의(수면사용, 하천점용 등),
 짚라인 타당성조사 및 기본계획수립용역 착수
- '18. 2. : 탐정호 수상레저타운 기본계획 수립 완료
- '18. 3. : 수상레포츠 추진을 위한 수면사용허가 신청(한국농어촌
 공사)
- '18. 8. : 한국농어촌공사 수면사용 허가 방문요청 협의
- '19. 1. ~ 5. : 수면사용(재임대) 관련 업무 협의

☐ 앞으로 추진계획

【체류형 숙박시설】

- '19. 7.~ 10. : 민간사업자 공모절차 진행
- '19.12. : 지역개발사업 구역지정 신청
- '20.02. : 사업시행자 및 사업시행계획 승인 신청

【수상레포츠】

- '19. 6. : 수면사용허가 검토 재협의(한국농어촌공사)
- '19. 7. : 수면사용허가 완료 즉시 수상레저 제안공고 및 제안서 접수
- '19. 8. : 수상레저업체 제안서 평가 및 업체 선정
- '19. 9. : 수상레저 관련 기반시설 조성 및 운영 개시

※ 한국농어촌공사 본사, 충남지역본부의 수면사용허가 재임대(논
 산지 임대 후 개인사업자 임대) 사항 검토 중으로 조속한 검토
 완료 및 수면사용허가 지속적 요청 추진

3 강경 근대역사 문화도시 조성

물류와 문화의 중심지였던 강경, 재조명 통한 관광명소화

근대문화가치
보존

관광콘텐츠
개발

- ① 논산 근대역사문화촌 조성 (서부내륙권 광역관광개발)
- ② 강경구락부 특화단지 조성
- ③ 강경산 문화공간 조성
- ④ 소금집 문화교양공간 조성

□ 총괄개요

(단위 : 백만원)

사업명	사업기간	사업량	사업비	비고
합계			23,200	
논산 근대역사문화촌 조성사업	2017~2021	- 근대역사문화촌 낭만거리조성 (A=9,995㎡, L=140M) - 근대건축물 신축, 복원·재현	14,970	
강경구락부 특화단지 조성사업	2016~2019	- 연면적 885㎡(지상1층~지상2층) - 근대서구식 5동 신축 (음식점 2, 숙박 2, 카페테리아 1)	4,000	
강경산 문화공간 조성사업	2017~2019	- 연면적 933㎡(지하1층~지상2층) - 문화관(북카페, 열람실, 전시실 등), 체험공방 등 건축	3,930	
소금집 문화교양공간 조성사업	2019	- 소금집 신축 재현 - 외부공간 조성 (주변 도라지꽃 장독대, 앞마당 등)	300	

1. 논산 근대역사문화촌 조성사업 [사부내륙권 광역관광개발]

◇ 물류와 문화의 중심지였던 강경, 근대역사문화도시로의
재조명·재창조 및 이를 통한 새로운 관광명소로 육성·지역
성장 동력 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 강경읍 중앙리 40-2일원($A=9,995m^2$)
- 사 업 비 : 금14,970백만원【국비 5,235 시비 9,735(보상 4,500 포함)】
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년
- 사업내용 : 낭만거리조성($L=140M$, 근대건축물 신축·재현, 해체·복원)

□ 그동안 추진상황

- '17. 6. : 논산 근대역사문화촌 조성 기본계획수립 완료
- '17. 12. : 사업계획 변경승인(문체부)
- '18. 2. : 지방재정투자심사 승인(충청남도)
- '18. 5. : 사업계획 사전 검토(국가공공건축지원센터)
- '18. 7. : 기초조사(인문콘텐츠 자료수집 및 정밀안전진단) 용역 착수
- '18. 10. : 기본구상 TF팀 구성(건축, 도시, 관광, 콘텐츠, 역사 등 전문가)
- '18. 12. : 관광활성화 콘텐츠 개발용역 착수
- '18. 12. : 정밀안전진단 선별조사 지장물 철거공사 착수
- '19. 4. : 논산근대역사문화촌 조성사업 자문위원회 회의 개최
논산근대역사문화촌 조성사업 건축전문가 현장자문
(시설물 철거 여부 및 범위결정) 실시


☐ 앞으로 추진계획

- '19. 6. : 근대역사문화촌 건축물 가치 및 활용방안 연구 용역 착수
- '19. 9. : 건축물 가치 및 활용방안 연구 용역 및 관광활성화 콘텐츠 개발 용역 준공
- '19. 9. : 건축설계(제안) 공모
- '19. 12. : 설계용역 착수
- '20. 6. : 관리운영방안 개발용역(임대, 위탁 등) 착수
- '20. 9. : 건축설계 완료
- '20. 10. : 공사착공
- '20. 12. : 관리운영방안 개발용역 완료
- '21. 12. : 시설공사 준공

□ 기대효과

- 근대역사문화촌 조성을 통해서 관광거점으로서 논산대표 관광명소로 육성하여 관광객 유입을 통한 지역활성화 및 논산관광의 한 축으로 발돋움.

불입 기본구상(안) 조감도

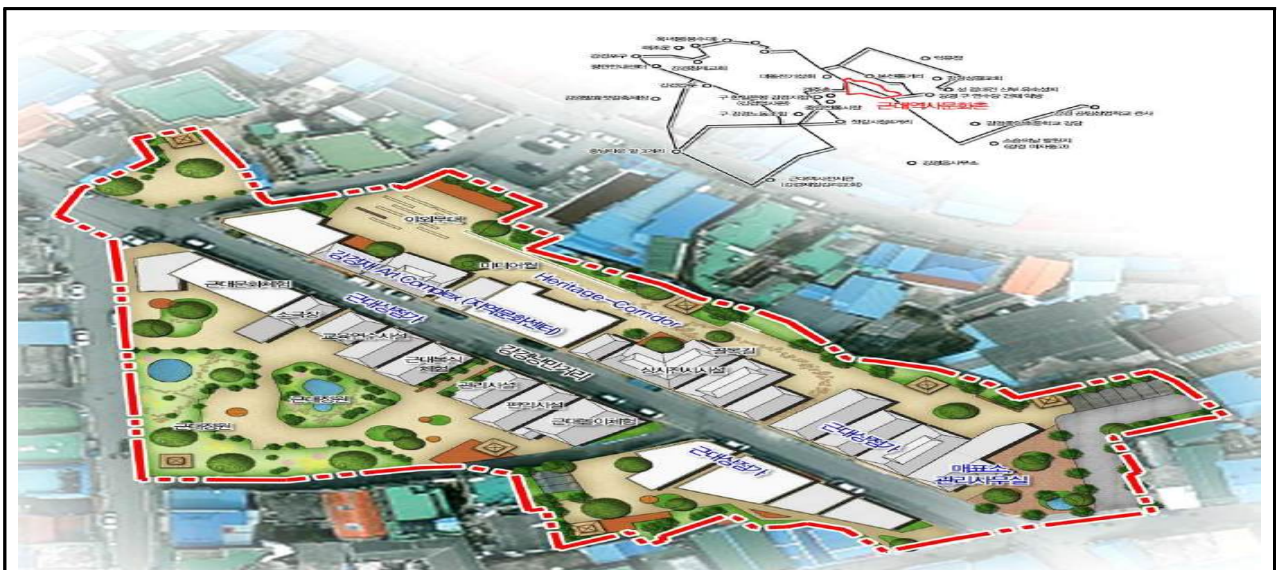

2. 강경구락부 특화단지 조성사업

- ◇ 조선후기 충청과 전북 물류요충지로 번창했던 강경으로, 상인들이 근대 사교·오락시설로 즐기던 옛모습 재현.
⇒테마관광 및 영화·드라마 촬영 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 중앙리 18-1일원(북옥근린공원 내)
- 사 업 비 : 금4,000백만원【국비 2,000, 시비 2,000】
- 사업규모 : 연면적 885㎡ 신축(지상 1층 ~ 지상 2층)
- 사업기간 : 2016 ~ 2019년(4년)
- 사업내용 : 근대서구식 5동(음식점 2, 숙박 2, 카페테리아 1)

□ 그동안 추진상황

- '16. 12. : 2동(양·일식당) 신축 준공
- '17. 12. : 2동(양·일식당) 내부공사 준공
- '18. 4. : 잔여 3동(숙박 2, 카페테리아 1) 신축 준공
- '18. 10. : 부설주차장 준공
- '19. 4. : 잔여 3동(숙박 2, 카페테리아 1) 내부공사 준공

□ 운영·관리계획

- '16. 4. : 관광자원화 (관광체육과+미래사업과) 부서간 업무 협업
※ 주요내용 : 사업발굴·계획수립·공사준공 단계까지는 미래사업과에서 추진하고 이후 운영·관리는 관광체육과에서 추진
- '19. 6. : 잔여 준공시설물 인계·인수(미래사업과 → 관광체육과)
- 관광체육과 협업('19. 6. 관광자원활용 및 활성화 운영계획용역 발주예정)

3. 강경산 문화공간 조성사업

- ◇ 강경의 역사와 문화의 정체성 확립 및 지역 역사문화자원과 연계한 문학·문화의 향유 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 북옥리 139-2일원(북옥근린공원 내)
- 사 업 비 : 금3,930백만원 【국비 1,500, 시비 2,430】
- 사업기간 : 2017 ~ 2019년(3년)
- 사업내용 : 연면적 957㎡ 신축(북카페, 열람실, 전시실), 체험공방 등

□ 그동안 추진상황

- '16. 5. : 기본계획수립 및 지방재정투자심사 승인
- '17. 12. : 설계공모 당선작 설계용역 완료
- '18. 5. : 실시계획인가 고시 및 미보상토지 수용 재결
- '18. 7. : 공사 착수
- '18. 10 ~ 12. : 암(岩)판정위원회 3차 자문심의(암석굴착공법 선정)
- '19. 1. : 물가변동 계약금액 조정(조달청)
- '19. 2. : (설계변경)계약심사심의위원회 개최(충남도청)
- '19. 3. : (설계변경)계약심사(충남도청)

□ 앞으로 추진계획

- '20. 2. : 시설공사 준공
- '20. 4. : 내부공사 및 전시물 제작설치용역 발주
- '20. 9. : 내부공사 및 전시물 제작설치용역 완료

4. 소금집 문화교양공간 조성사업

- ◇ 박범신 작가의 소설 “소금”의 모티브가 된 장소로 북옥공원(옥녀봉) 나들이 문화교양함량 관광코스로 개발

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 강경읍 북옥리 30-6(강경북옥공원 일원)
- 사 업 비 : 금300백만원【시비 300】
- 사업기간 : 2019년
- 사업내용 : 소금집(소금창고) 재현 및 외부공간 조성

☐ 기본계획(안)

- 진입부 ⇄ 소금창고 재현 ⇄ 외부공간 조성(소설배경 분위기 유지)
- 주요공간 : 소금창고 / 안마당 / 도라지 밭 / 진입공간 / 주차공간 등

☐ 그동안 추진상황

- '18. 10. : 추진계획 수립
- '19. 5. : 기본설계용역 완료 및 실시설계용역 발주

☐ 앞으로 추진계획

- '19. 7. : 실시설계용역 완료
- '19. 8. : 시설공사 착수
- '20. 1. : 시설공사 준공

4 충청유교문화원 건립사업

◇ 기호유교문화의 전통과 가치를 재조명하고 현대적으로 계승

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 노성면 병사리 산41-4 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 280억원(국비 84, 도비 98, 시비 98)
- 주요내용 : 학술·연구시설, 전시시설, 교육연수시설, 수장고, 편의시설 등 조성
- 시설물현황
 - 문화원 : 학술연구 및 전시시설, 관리동 등(지하1층, 지상2층)
 - 연수원 : 교육연수시설(관리동 및 식당 1동, 연수동 6동)

☐ 그동안 추진상황

- '19. 1. : 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 고시
- '19. 1.~ : 실시계획인가 및 건축인허가 절차 이행

☐ 앞으로 추진계획

- '19. 6. : 기공식 및 공사 착공
- '20. 12. : 공사 준공 및 유교문화원 운영

☐ 기대효과

- 예절과 유학의 본산으로서의 정체성 확립과 지역민의 자부심 고취

5 충청유교문화권 개발사업

- ◇ 유교를 현대적으로 해석하여 전통문화와 현재가 어우러지는 관광형 테마파크를 조성, 우리시 관광명소로 개발하고 지역경제 활성화에 기여코자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 충청유교문화권 개발사업
- 위치 : 논산시 일원(약90,000㎡)
- 사업비 : 45,970백만원(국비 20,735 지방비 25,235)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년)
- 사업내용 : 군자의 도량 육예(六藝)체험관, 군자의 창 디지털 영상관, 신명울 및 신명마당, 저자거리

□ 그동안 추진상황

- '15. 4. : 충청유교문화권 종합개발계획 용역 착수(문체부)
- '15. 10. : 논산 유교문화권 개발 기본구상 용역 완료
- '16. 1. : 충청유교문화권 종합개발계획 지자체 사업 발굴 및 제안
- '16. 4. : 사업 최종 선정(문체부-문화관광연구원)
- '16. 6. : 충청유교문화권 종합개발계획 용역 완료(문체부)
- '18. 12. : 유교문화권 개발사업 타당성조사 및 기본구상 수립 용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- '19. 8 : 문체부 및 기재부 보조사업 적격성 심사
투자심사 지방재정 투자심사 의뢰(중앙심사)
- '20. 1 : 토지매입, 도시관리계획 결정(변경) 용역 등 시행
