




산림공원과



순 서

I. 2018년도 추진목표 및 추진전략

II. 2018년도 주요업무 추진상황

1. 조림 사업
2. 산림 토목 사업
3. 산불 방지
4. 숲가꾸기 사업
5. 생활권 위험목 정비사업
6. 산림병해충 방제사업
7. 공공산림가꾸기단 운영
8. 국토공원화 사업
9. 노성산 애향공원 조성사업
10. 시민공원 족욕체험장 설치사업
11. 반야산 녹지조성 및 등산로 정비사업
12. 마산근린공원 조성사업
13. 양촌자연휴양림 조성보완사업
14. 도시생활권 등산로 정비사업

I. 2018년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 산림경영을 통한 탄소배출권 확보경쟁 대비
- 산림의 휴양·문화 공간을 통한 다양한 체험문화 확산
- 취약계층, 청·장년실업자의 생활안정을 위한 녹색일자리 창출
- 지구 온난화 현상으로 산사태, 산림 병해충 등 산림 피해 대비

추진전략

- 조림, 숲 가꾸기를 통한 지속가능한 산림경영
- 생활주변 공원·녹지·산림휴양시설 조성확대로 시민의 삶의 질 향상
- 공공산림가꾸기, 산림서비스 도우미 등을 통한 녹색 일자리 창출 확대
- 사방사업, 병해충 예찰, 산불예방 활동으로 산림 재해 방지 체계 확립

II. 2018년도 주요업무 추진상황

1 조림 사업

◇ 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 가치 있는 산림자원 조성 및 지속가능한 산림경영 기반 구축

☐ 사업개요

- 사업량 : 175ha
 - 경제수일반 135ha, 힐링숲조성 5ha, 경관조림 15ha, 산림재해 방지조림 20ha
- 추진시기 : 2018. 2월 ~ 11월
- 총사업비 : 798백만원(국비 332 도비 140 시비 326)

☐ 그동안 추진상황

- '18년 2월 : 준기 조림사업 실시설계용역 완료
- '18년 3 ~ 4월 : 준기 조림사업 145ha 완료(경제수일반 105ha, 힐링숲조성 5ha, 경관조림 15ha, 산림재해 방지조림 20ha)

☐ 앞으로 추진계획

- '18년 10 ~ 11월 : 준기 조림사업 추진(경제수일반 30ha)

2 산림 토목 사업

- ◇ 산림재해 예방을 위한 선제적 조치 강구
- ◇ 산림경영 및 관리 기반시설 확보로 가치 있는 산림자원 육성

☐ 사업개요

- 사방사업 : 사방댐 2개소, 계류보전 2개소, 산지사방 1ha, 댐준설 3개소
- 임도사업 : 간선임도 2km, 구조개량 1km, 임도보수 10km
- 추진시기 : 2018. 1월 ~ 11월
- 소요예산 : 1,535백만원(국비 1,105 도비 276 시비 154)

☐ 그동안 추진상황

- '18년 2월 : 사방 및 임도사업 실시설계 및 사방사업 착공
- '18년 4월 : 임도사업 착공
- '18년 6월 : 사방사업(산지사방, 계류보전) 및 임도사업(구조개량, 임도보수) 완료

☐ 앞으로 추진계획

- '18년 7월 : 사방사업(사방댐) 추진
- '18년 11월 : 간선임도 및 사방댐준설 추진

3 산불 방지

◇ 신속한 초기대응 및 효율적인 지상진화로 산불피해 최소화

□ 사업개요

- 산불조심 기간 : 봄철 2. 1. ~ 5. 31. 가을철 11. 1. ~ 12. 15.
- 사업내용
 - 산불방지 대책본부 설치 운영
 - 산불감시원 및 산불전문예방진화대 운영
 - 산불무인감시카메라(4대) 및 산불소화시설(쌍계사) 운영
 - 산불예방 감시활동 및 산불예방 홍보
- 소요예산 : 1,098백만원(국비 228 도비 173 시비 697)

□ 그동안 추진상황

- '18년 1 ~ 5월 : 봄철 산불전문예방진화대 48명 선발 운영
 - 봄철 산불조심기간 운영으로 산불예방 및 진화 활동
- '18년 6 ~ 7월 : 여름철 산불전문예방진화대 12명 선발 운영
 - 자체 시비 운영

□ 앞으로 추진계획

- '18년 11 ~ 12월 : 가을철 산불전문예방진화대 운영

4 숲가꾸기 사업

◇ 산림을 경제·환경적으로 가치 있는 자원으로 육성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 주요내용 : 1,053ha
 - 큰나무가꾸기 203ha, 어린나무가꾸기 50ha
 - 조림지가꾸기 800ha
- 총사업비 : 1,553백만원(국비 777 도비 233, 시비 543)

☐ 그동안 추진상황

- '18년 4 ~ 6월 : 숲가꾸기(1권역), 어린나무가꾸기 및 덩굴 제거사업 완료
- '18년 7월 : 숲가꾸기(2권역) 사업발주, 숲가꾸기(3~4권역) 실시
설계 용역발주, 조림지가꾸기 800ha 실시설계

☐ 앞으로 추진계획

- '18년 8월 : 조림지가꾸기 800ha 추진
- '18년 8 ~ 10월 : 숲가꾸기(3~4권역) 사업 추진

5 생활권 위험목 정비사업

◇ 농·산촌의 노령화로 대처가 어려운 주택 인접 위험목 제거
민원에 대하여 신속대응으로 안전한 행정서비스 제고

□ 사업개요

- 대 상 : 독거노인·저소득층 주택 등에 인접한 거목이 방치되어
태풍·집중호우 시 도복 및 낙지 우려가 있는 나무
- 위 치 : 논산시 내동 292-4 외 56개소
- 사 업 량 : 111그루(벌채 106그루, 가지치기 5그루)
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 6월
- 총사업비 : 60백만원(전액 시비)

□ 그동안 추진상황

- '18년 1월 : 읍·면·동 위험목 신청 접수
- '18년 3 ~ 4월 : 실시설계용역 착수 및 완료
- '18년 5월 : 2018년 생활권 위험목 정비사업 착수
- '18년 6월 : 사업 완료(57개소, 111그루 제거)

□ 앞으로 추진계획

- '18년 8 ~ 12월 : 공공산림가꾸기단을 활용하여 위험목(中·小목)
조사 및 제거 실시

6

산림병해충 방제사업

◇ 산림병해충(소나무재선충병 포함)에 대한 조기발견·적기 방제로 산림생태계의 건강성 유지

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 관내
- 사업량
 - 산림병해충 예찰방제단 1개단(4명)
 - 일반병해충 방제 189ha(꽃매미 25ha, 흰불나방 40ha, 미국선녀벌레 25ha, 갈색날개매미충 80ha, 기타해충 19ha)
 - 소나무재선충병 방제 73ha(지상방제 10ha, 예방나무주사 63ha)
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 총사업비 : 326백만원(국비 71 도비 77 시비 178)

□ 그동안 추진상황

- '18년 1 ~ 3월 : 소나무재선충병 긴급방제사업(모두베기·나무주사) 실시
- '18년 2 ~ 7월 : 산림병해충 예찰방제단 1개단 운영
- '18년 2 ~ 3월 : 소나무재선충병 예방나무주사사업(89ha) 실시
- '18년 3 ~ 7월 : 일반병해충 방제사업 실시
- '18년 5 ~ 7월 : 소나무재선충병 지상방제사업 실시

□ 앞으로 추진계획

- '18년 11 ~ 12월 : 소나무재선충병 예방나무주사사업(20ha) 실시

7 공공산림가꾸기단 운영

- ◇ 저소득층 등 취약계층을 고용하여 일자리를 창출하고, 산물수집 확대로 산림자원의 활용도 제고 및 산림 현장 민원 처리

□ 사업개요

- 운영인원 : 산림바이오매스수집단 8명, 숲가꾸기자원조사단 1명
- 운영기간 : 2018. 3월 ~ 12월
- 활동임무
 - 공공성이 강한 생활권 주변 산림정비 및 숲가꾸기 산물을 수집하여 산물 활용 촉진
 - 산림에서 발생하는 각종 산림피해(덩굴류, 병해충, 산림재해 등)에 신속대응하고 시민생활에 지장을 주는 현장 민원 처리
- 총사업비 : 177백만원(국비 90 도비 26 시비 61)

□ 그동안 추진상황

- '18년 2월 : 공공산림가꾸기단 모집 공고
- '18년 3 ~ 7월 : 공공산림가꾸기단 운영 및 산림 현장 민원 처리(80건)

□ 앞으로 추진계획

- '18년 8 ~ 12월 : 위험목 제거 등 산림 현장 민원 처리
- '18년 11월 : 읍·면·동 땀감나누기사업 실시

8 국토공원화 사업

◇ 도시환경 개선과 시민의 삶의 질 향상을 위하여 아름답고 깨끗한 녹색환경 조성

☐ 사업개요

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비	비 고
계	19	1,390	
생활권 주변 공원조성	4	740	생활권 쌈지공원조성 등
공원 정비 및 유지관리	8	310	공원 유지보수, 생육환경개선사업 등
쌈지공원 제초 등 관리	7	340	기 조성지 제초, 전정작업

☐ 그동안 추진상황

- '18년 1 ~ 6월 : 공원 정비 등 유지관리 6건 완료
- '18년 4 ~ 5월 : 제초 등 관리사업 7건 착수, 생활권 주변사업 4건 완료
- '18년 6월 : 북옥공원 광장 정비사업, 반야산 등산로변 관목류 식재사업, 마전리 경관 정비사업 등 완료

☐ 앞으로 추진계획

- '18년 7 ~ 11월 : 공원 정비 등 유지관리사업 2건 추진
- '18년 7 ~ 12월 : 공원조성 및 정비 완료사업(7건) 제초 등 유지관리

9 노성산 애향공원 조성사업

- ◇ 노성산 주변 노성향교, 쫄리사, 윤증고택 등 역사 문화시설과 연계하여 편의시설을 확충함으로써 방문(관광)객의 건강 증진 및 역사문화를 향유할 수 있도록 문화공원 조성

<사업 개요>

- 위 치 : 충남 논산시 노성면 교촌리 346-10번지 일원
- 사업규모 : 25,207㎡(7,625평)
- 총사업비 : 3,054백만원(국비1,427, 도비650, 시군비977)
※ 국비46.7%, 도비21.3%, 시비32%
- 사업기간 : 2016 ~ 2019
- 추진근거 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 도시공원 및 녹지등에 관한 법률

※ 공사 도급 현황

- 공 사 비 : 2,505백만원(도급 1,913백만원, 관급 592백만원)
- 공사기간 : 2016. 11. 30. ~ 2019. 3. 15.
- 공사내용
 - 식 재 공 : 소나무 외 26종
 - 시설물공 : 노성산성 이미테이션 1식, 선비상 1식, 조형돌담 2개소, 전통돌담 116m, 데크로드 636㎡, 출렁다리(1.5m×38m) 1개소 등
 - 휴게시설 : 팔각전망대 외 37종
- 공 정 율 : 65%(2018. 7월 현재)

□ 그동안 추진상황

- 2014. 03. : 『노성산 애향공원조성 도시계획시설결정 및 공원조성 계획 용역』 착수
- 2015. 08. : 재정 투자심사 완료(2016. 7. 재심사 : 총사업비 변경)
- 2015. 10. : 논산시의회 의견 청취
- 2016. 04. : 충청남도 도시계획위원회 심의
- 2016. 06. : 도시관리계획(문화공원)결정 및 지형도면고시(충청남도)
- 2016. 09. : 도시관리계획(공원조성계획) 결정 및 지형도면고시(논산시)
- 2016. 10. : 논산시 도시계획시설(문화공원) 사업 실시계획 인가
- 2016. 11. : 공사 착공
- 2017. 12. : 제1차 기성준공(공정율 45%)
(부지정지작업, 출렁다리, 순환산책로 등 완료)
- 2018. 05. : 제2차 기성준공(공정율 65%)
(출렁다리~전망대, 다목적광장 흙메우기 및 조경석쌓기 등)

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 03. : 전체 사업(토목, 조경, 전기 등) 준공

□ 사업계획도



10 시민공원 족욕체험장 설치사업

◇ 충효의 고장 이미지에 걸맞게 논산 시민공원에 연로한 노인층을 위한 건강 물놀이 시설인 족욕 체험장 설치로 건강 증진

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 관촉동 342번지(시민공원 진입광장 옆)
- 규 모 : 면적 220m²
- 사 업 비 : 166백만원(도금액 165, 관급자재대 1)
- 사업기간 : 2017. 3. 27. ~ 2018. 3. 28.
- 운영계획 : 하절기(3월~10월)18:00~23:00, 동절기(11월~12월)11:00~22:00
※ 향후 운영(상황) 계획에 따라 변동될 수 있음

□ 그동안 추진상황

- 2017. 02. : 실시설계 완료
- 2017. 03. : 공사 착공
- 2017. 12. : 급탕시설(배관 및 보일러실) 완료
- 2018. 04. : 조경공사(관목식재 등) 완료
- 2018. 06. : 공사준공 및 족욕체험장 개장

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 07.~12. : 족욕체험장 운영 및 시설 유지관리
- 2018. 09. : 계절별 이용자 불편 해소를 위해 비(빛)가림시설 설치

□ 위치도 및 이미지



11 반야산 녹지조성 및 등산로 정비사업

◇ 시민이 많이 이용하는 반야산 숲길 및 완충녹지 정비로 쾌적하고 아름다운 생활 주변 녹색 공간 확충

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 내동 1208번지 일원
- 사 업 량 : 완충녹지(6,000㎡), 숲길(320m)
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 6.
- 사업내용 : 수목식재, 산책로, 전망데크, 벤치 등
- 총사업비 : 300백만원(전액 시비)


☐ 그동안 추진상황

- '18. 03. 19. : 공사 착공
- '18. 06. 16. : 공사 준공
 - 수목식재 : 소나무(장송) 외 5종 6,036주
 - 데크계단 및 전망데크, 벤치 설치

☐ 앞으로 추진계획

- '18. 07.~12. : 제초, 시비, 물주기 등 유지관리

☐ 위치도 및 현황평면도

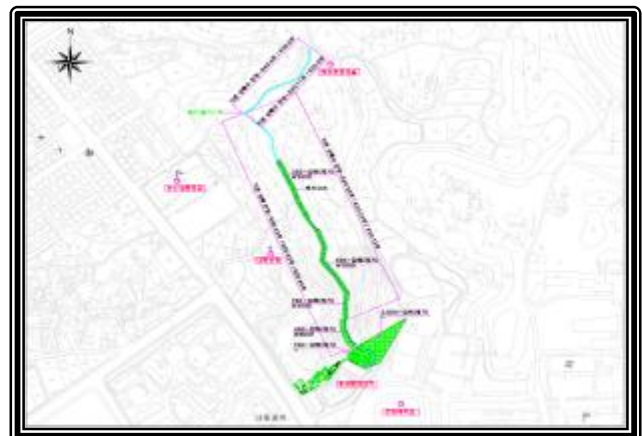

12 마산근린공원 조성사업

◇ 마산근린공원 조성으로 시민과 면회객 등이 이용할 수 있는 휴양시설 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 연무읍 마산리 산6-19번지 일원
- 사업량 : 9,120㎡
- 사업기간 : 2018년
- 사업내용 : 휴양시설, 조경시설, 운동시설 등 공원조성
- 총사업비 : 1,500백만원(전액 시비)

□ 그동안 추진상황

- '18. 02. : 토지 보상금 지급(1,292백만원)
- '18. 04. : 실시설계용역 착수
- '18. 05. : 실시설계용역 일시중지
- '18. 06. : 사업대상지 내 분묘 이장 공고

□ 앞으로 추진계획

- '18. 07. : 용역 재착수 및 공원조성계획변경 등 절차 진행
- '18. 10. : 용역 준공
- '18. 11. : 공사 착공
- '19. 06. : 공사 준공

□ 위치도 및 사업계획도



13 양촌자연휴양림 조성보완사업

◇ 산림휴양 문화의 다양화 되는 이용자 수요를 충족할 수 있는 시설을 확충하기 위한 양촌자연휴양림 제2지구 사업 계획으로 서비스 품질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 양촌면 남산리 산12-4번지 일원
- 면 적 : 약 40ha
- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2019년 12월
- 주요시설 : 숲속의 집, 물놀이장 확장, 상·하수도시설, 기타부대시설 등
- 사 업 비 : 2,400백만원(국비 1,200 도비 600 시비 600)

□ 그동안 추진상황

- '18. 2월 : 일상감사 및 계약심사 승인
- '18. 3월 : 사업계획변경
- '18. 4월 : 실시설계 용역 협상에 의한 타당성 검토
- '18. 4월 : 제안서 평가위원 공고 모집
- '18. 5 ~ 7월 : 실시설계 용역 공고중

□ 앞으로 추진계획

- '18. 8월 : 평가위원 선정 및 용역업체 선정
- '18. 8 ~ 11월 : 실시설계 용역 착수 및 준공
- '18. 11월 ~ '19. 11월 : 공사 착수 및 준공

14 도시생활권 등산로 정비사업

◇ 도시근교 생활권을 중심으로 한 산행수요 증가에 대비한 쾌적하고 안전한 산행환경 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 노성면 읍내리 노성산 일원
- 면 적 : 등산로 정비 3km
- 사업내용 : 등산로 노면 정비, 안전시설 및 편의시설 설치 등
- 총사업비 : 114백만원(국비 57 도비 11 시비 46)

☐ 그동안 추진상황

- '18. 2 ~ 3월 : 실시설계용역 착수 및 준공
- '18. 4 ~ 7월 : 도시생활권 등산로 정비사업 착수 및 준공

☐ 앞으로 추진계획

- '18. 7 ~ 12월 : 등산로 점검 등 사후관리

