

마을자치분권과

순 서

2021년도 주요업무 추진상황

1. 논산시 자치기반 구축을 위한 마을자치 지원강화
2. 주민자치 역량강화 및 활성화 지원
3. 주민참여예산제 강화
4. 논산천 둔치 꽃단지조성 사업
5. 기초생활거점 조성사업
6. 마을만들기 자율개발사업
7. 농촌협약 포괄공모사업 용역 추진
8. 논산형 마을만들기 공모사업 추진

1 논산시 자치기반 구축을 위한 마을자치 지원강화

- ◇ 동고동락 마을자치회의 화합·실천 프로젝트로 주민주도 형태의 다양한 마을자치활동을 장려하고 지속적인 자치역량 교육을 통해 마을자치회 주민 스스로 마을의 삶을 바꾸는 동기부여 제공

□ 그동안 추진 사항

- 논산시 동고동락 마을자치회 활성화 지원사업 운영
 - 지원대상 : 논산시 동고동락 마을자치회 중 모니터링 참여 마을 및 주민참여예산(동고동락 마을자치회 지원사업) 미신청 마을
 - 지원예산 : 66,000천원
 - 선정대상 : 13개소 마을자치회 (복합2, 경관5, 동고동락1, 온정나눔5)
- 논산시 동고동락 마을자치회 지원사업 운영현황

연도	지원예산 (천원)	계	분야별(개소)				
			동고 동락	교육	문화	온정 나눔	경관 개선
2021년	904,130	342	59	8	25	59	191

- 342개 사업 중 5월 현재 추진완료 67개, 진행 중인 사업 29개소로 코로나-19로 방역지침에 따라 사업이 다소 지연되고 있으나 추진 독려하여 2021년 내 완료 계획

□ 앞으로 추진계획

- 2021년 논산시 마을자치실천대학 운영
 - 추진기간 : 2021. 7. ~ 8.
 - 참여대상 : 마을자치회 · 주민자치회 위원, 일반시민
 - 주요내용 : 풀뿌리 마을민주주의의 의미와 우리 삶에 영향을 미치는 주민자치 활동, 마을 기록의 중요성, 의사결정하기 등의 8-9회차 커리큘럼으로 구성하여 운영
 - 추진방법 : 시청 · 읍면동 회의실의 화상회의시스템을 사용하여 일방소통 비대면 교육이 아닌 주민과 양방향 소통 가능한 교육 운영
- 찾아가는 마을자치회 주민역량강화 운영 재개
 - 마을회관 · 경로당에 찾아가 마을회의원칙을 교육하는 사업으로 코로나 백신 1차 접종 완료시기에 맞춰 80개 마을자치회 교육 추진

2 주민자치 역량강화 및 활성화 지원

◇ 풀뿌리 주민자치 및 지속발전가능한 주민자치 실현을 위해 주민자치 교육과 사업을 추진하여 역량 강화를 통한 주민자치 활성화 도모

□ 그동안 추진 사항

- 주민자치 아카데미 사업 계획 수립 및 보조금 교부 신청
 - 대 상 : 15개 읍·면·동 주민자치 위원
 - 사업예산 : 10,000천원(도비 5,000천원, 시비 5,000천원)
 - 사업내용 : 주민자치 이론 및 우수사례 학습, 회의 기법 학습 등
- 주민자치회 발굴 사업 지원
 - 지원대상 : 15개 읍·면·동 주민자치회

사업명	예산액 (천원)	사업내용	비 고
계	240,000		
주민자치 발굴 사업지원	150,000	· 주민자치 역량 강화, 평생교육, 인문학 등 각종 교육 사업 및 발굴 사업	읍·면·동별 10,000천원
주민총회 개최 지원	90,000	· 읍·면·동 주민자치회 주민총회 개최	읍·면·동별 6,000천원

- 논산시 주민자치협의회 사무실 설치 추진
 - 위 치 : 논산 시민운동장 38번 사무실(42㎡)
 - 예 산 : 20,000천원
 - 목 적 : 주민자치협의회 정기회의, 대외활동 등 추진 공간 마련
- 주민자치회 읍·면·동 담당자 업무 교육실시 (2021. 5)

□ 앞으로 추진계획

- 제2회 논산시 주민총회 개최
 - 추진기간 : 2021. 8. ~ 9.
 - 추진대상 : 15개 읍·면·동 주민자치회
 - 사업내용 : 주민자치회 운영계획, 자치계획(안) 결정, 주민참여예산제 의결 등을 위한 주민 공론의 장인 주민총회 개최 지원
- 2021년 8. ~ 9. : 주민자치 아카데미 추진

3 주민참여예산제 강화


- ◇ 주민참여예산제의 내실있는 운영을 통해 예산편성 등 예산 전 과정에 주민의 실질적 참여를 보장하여 재정 투명성 확보 및 자치분권 활성화 도모

□ 그동안 추진 사항

- 2021. 3. : 2020년도 주민참여예산 운영성과 평가
- 2021. 3. : 2021년 논산시 주민참여예산제 운영계획 수립
- 2021. 4~ 5. : 주민참여예산제 언택트 교육 동영상 제작 용역
- 2021. 5. : 청소년 주민참여예산학교 운영계획 수립
- 2021. 5. : 2021년 주민참여예산제 읍면동 담당자 교육 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2021. 6. : 주민참여예산제 언택트 교육자료 배포(사이버 문화센터, 市 유튜브 등)
- 2021. 6. : 2021년 찾아가는 주민참여예산학교 운영(15개 읍면동)
- 2021. 6. ~ 8. : 2021년 논산시 청소년 주민참여예산학교 운영
- 2021. 6. ~ 12. : 「2022년 주민참여예산」 제안사업 공모 추진

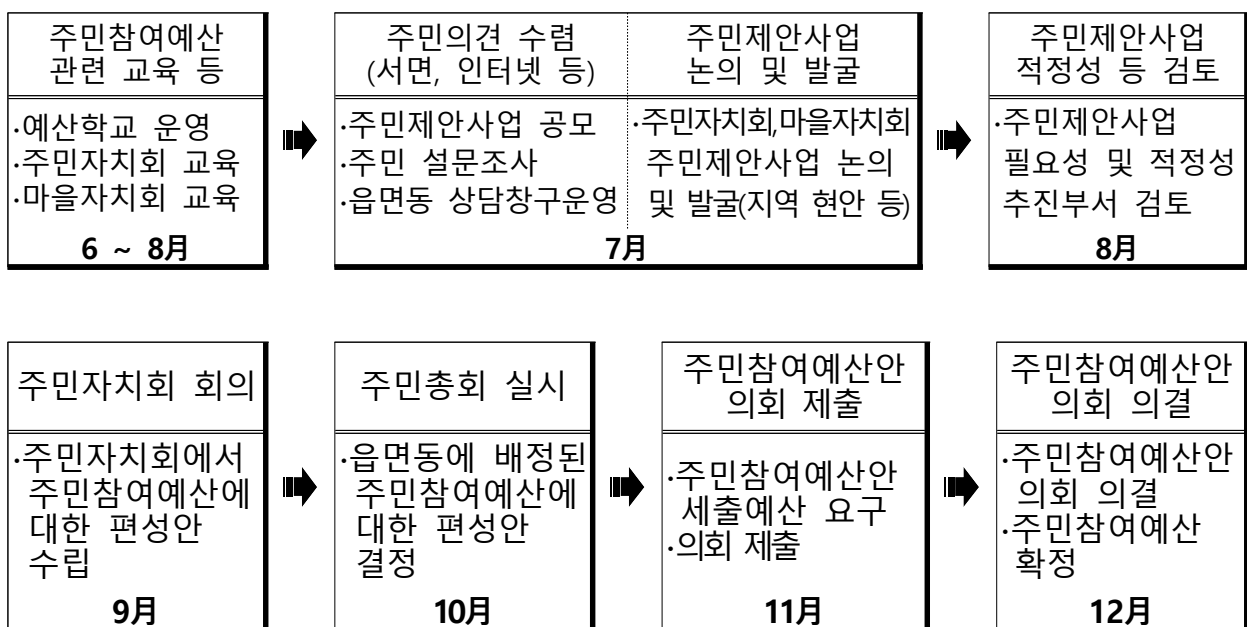

4 논산천 둔치 꽃단지조성 사업

논산천 인근 수변환경개선과 볼거리 제공을 위한 유채꽃단지 조성

☐ 그동안 추진 사항

시기	작업의 종류	내 용
'20. 09. ~ '20. 10.	<ul style="list-style-type: none"> 경운작업 로타리작업 파종작업 	<ul style="list-style-type: none"> 땅을 20cm이상 깊게 충분히 갈아 줌(경운) 깊이 같은 흙을 파종이 용이하도록 잘게 부수어 줌(쇄토) 유채 파종 후 종자가 보이지 않을 정도로 복토
'20. 10. ~ '21. 04.	<ul style="list-style-type: none"> 관수작업 양분공급 	<ul style="list-style-type: none"> 관수는 땅속 깊이 물이 들어갈 수 있도록 충분히 관수 잡초와의 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 수시로 잡초제거 논산천 일대 환경정비를 함께 실시하여 주변경관 개선 효과 상승
'21. 05. ~ '21. 06.	<ul style="list-style-type: none"> 유채 베기 꽃단지 정리작업 	<ul style="list-style-type: none"> 결실 후 유채꽃 베기 및 씨받기 토양이 휴식할 수 있도록 로타리작업 실시 10월경 씨앗 파종 및 내년도 개화 준비

☐ 문제점 및 대책

- 조성부지 환경의 황폐화로 종자의 생장환경 저해
 - 논산시새마을협의회 · 부녀회의 민 · 관이 힘을 합쳐 자갈골라내기, 잡초 정리 등 꽃단지 조성환경개선
- 파종 후 강우량 부족으로 수분공급의 어려움
 - 파종 후 강우량부족으로 인해 살수차 임대를 통한 직접 관수를 진행하였고, 수시 현장점검으로 토양의 건조상태 확인

☐ 앞으로 추진계획

- 하반기 꽃단지 조성 준비
 - 베어낸 부지에 토양이 휴식할 수 있도록 로타리 작업진행
 - 하반기 식재를 위한 종자선정 및 파종준비

5 기초생활거점 조성사업

일상생활의 거점기능을 수행하고 있는 면소재지의 보유자원과 입지적 장점을 활용한 일상생활거점기능 강화로 주민의 삶의 질 향상에 기여

☐ 연산면 기초생활거점 조성사업

- 사업위치 : 논산시 연산면 청동2리, 한전1리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업비 : 1,118백만원 (국 783, 시 335)
 - ※ 총 사업비 4,000백만원 (국 2,800, 시 1,200)
- 사업내용 : 연산별당 조성, 연산사랑채 조성, 선비로 경관개선, 지역역량강화
- 주요 추진 사항
 - 2021. 4. 26. : 충청남도 기본계획 승인

☐ 광석면 기초생활거점 조성사업

- 사업위치 : 논산시 광석면 신당1, 2리, 이사2리, 천동4리 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 사업비 : 663백만원 (국 464, 시 199)
 - ※ 총 사업비 4,000백만원 (국 2,800, 시 1,200)
- 사업내용 : 빛돌세대공감교류공간 조성, 보행환경 정비, 지역역량강화
- 주요 추진 사항
 - 2021. 4. 23. : 충청남도 광역계획지원단 1차 협의
 - 2021. 5. 12. : 충청남도 광역계획지원단 2차 협의

☐ 가야곡면 기초생활거점 조성사업

- 사업위치 : 논산시 가야곡면 육곡1, 2리, 야촌1리, 왕암2리 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 사업비 : 190백만원 (국 133, 시 57)
 - ※ 총 사업비 4,000백만원 (국 2,800, 시 1,200)
- 사업내용 : 다목적센터 및 광장조성, 상가거리활성화, 안심보행로 조성, 지역역량강화
- 주요 추진 사항
 - 2021. 4. 12. : 충남공공디자인센터 자문 협의

6 마을만들기 자율개발사업

농촌마을의 삶의 질을 높이기 위해 주민주도형 공동체 활동을 장려하고, 주민주도의 공동체적 삶을 영위하는데 필요한 기초생활기반 확충, 지역경관개선, 지역역량강화 사업 지원

☐ 사업개요

구분	사업기간	위치	주요내용	사업비 (백만원)	비고
자율개발	2019 ~ 2021	채운면 야화1리	다목적광장 및 이야기 담장조성	210	각 사업별 총사업비 500백만원 (전환보전금 350, 시 150)
		채운면 화정2리	다목적광장, 공동체쉼터조성	240	
		상월면 산성리	커뮤니티센터 및 광장 조성 등	160	
	2020 ~ 2022	노성면 구암리	마을쉼터조성 정원조성 운동실 조성	200	각 사업별 총사업비 500백만원 (도 150, 시 350)
		채운면 심암1리	애국지사 기념관 및 정원 안내판설치	200	
신규마을	2019 ~ 2021	양촌면 반곡리	21,331㎡, 27세대 주거단지조성	300	총사업비 1,080백만원 (국 756, 시 324)

☐ 그동안 추진 사항

- 2021. 01. : 야화1, 화정2, 산성리 사업 착공
- 2021. 05. : 야화1, 화정2, 산성리 토공 및 구조물 추진
- 2021. 05. : 구암, 심암1리 기본 및 시행계획수립 추진
- 2021. 05. : 황산별도자예술인마을 시행계획 관련부서 협의 추진

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06 : 구암, 심암1리 기본 및 시행계획수립 승인
- 2021. 07 : 구암, 심암1리 사업 발주 및 착공
- 2021. 07 : 야화1, 화정2 사업 준공
- 2021. 07 : 황산별도자예술인마을 시행계획승인
- 2021. 07 : 황산별도자예술인마을 사업 공사발주 및 착공
- 2021. 08 : 산성리 사업 준공
- 2022. 06 : 구암, 심암1리 사업 준공
- 2022. 06 : 황산별도자예술인마을 사업 준공

7 농촌협약 포괄공모사업 용역 추진

농식품부와 지차체가 협약을 통해 정책적 협력 거버넌스를 구축하고, 지원방식을 전환하여 지방분권 시대에 효과적으로 대응

□ 용역개요

- 용역명 : 논산시 농촌공간 전략계획 및 생활권 활성화계획수립
- 수탁자 : 한국농어촌공사 충남지역본부
- 용역사 : (주)오씨에스 도시건축사사무소
- 용역비 : 5억원
- 용역기간 : 2021. 4. ~ 2023. 1.(22개월)

<농촌협약>

- 협약주체: 농식품부장관, 시장·군수
- 협약기간: 5년(사업기간)
- 협약규모: 430억원(국비 70%, 지방비 30%)
- 전제조건: 마을만들기 포함 이양사업 연계·기획하며, 농촌공간 전략계획 및 제2기 농발계획과 연계된 농촌생활권 활성화계획을 수립하고 추진체계를 구성·운영
- 사업내용: 사업선정시 농촌중심지 활성화, 기초생활거점 조성, 마을만들기, 지역역량강화 등 농촌지역 종합개발

□ 그동안 추진 사항

- 2021. 01. 15. : 한국농어촌공사 충남본부 위수탁 협약 체결(계획수립 용역 수행)
- 2021. 02. 25. : 논산시 농촌공간 전략 및 활성화계획 수립 용역 제안서 평가
- 2021. 03. 25. : 논산시 농촌공간 전략 및 활성화계획 수립 용역 착수
- 2021. 05. 26. : 논산시 현황조사 실시 및 설문조사 인원 선정

□ 앞으로 추진계획

- 2022. 05. : 농식품부에 예비계획서 제출
- 2022. 06. : 농식품부 심사위원회 시·군 평가
- 2022. 12. : 농식품부와 논산시 간 협약체결

8 논산형 마을만들기 공모사업 추진

농림축산식품부 일반농산어촌개발사업의 마을만들기 사업이 재정분권에 따른 지방이양과 관련하여 우리시 농촌마을 동고동락 공동체 활성화를 위한 일환으로 전환사업보전금을 활용하여 주민주도의 논산형 마을만들기 공모사업을 추진

☐ 사업개요

구분	사업기간	위치	주요내용	사업비 (백만원)	비고
21 논산형 마을만들기 자율개발	2021 ~ 2022	연무읍 봉동3리	농업경관 팜 조성	100	각 사업별 총사업비 200백만원 (전환보전금 140, 시 60)
		노성면 병사1리	농촌경관 쉼터 및 테마공간 조성	100	
		상월면 주곡리	농촌생태 체험장 및 경관담장 조성	100	
		부적면 탑정2리	농촌경관 쉼터 및 테마길 조성	100	
		벌곡면 양산2리	무지개 마을학교 및 테마길 조성	200	총사업비 500백만원 (전환보전금 350, 시 150)

☐ 그동안 추진 사항

- 2020. 12. : 논산형 마을만들기 자율개발사업 대상 기초마을 발굴
- 2020. 12. : 기초마을 대상 예비계획서 수립 용역 착수(30백만원)
- 2021. 04. : 기초마을 대상 예비계획서 수립 용역 완료
- 2021. 04. : 논산형 마을만들기 자율개발사업 대상마을 평가 및 선정

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06 : 봉동지구 외 4개마을 마을만들기 기본 및 시행계획수립 용역 발주
- 2021. 09 : 봉동지구 외 4개마을 마을만들기 기본 및 시행계획수립 완료
- 2021. 10 : 공사발주 및 착공
- 2022. 12 : 준공
